



Finansdepartementet

# Innspill til arbeidet med ny rammeavtale for KS-ordningen

Ingvild Melvær Hanssen

KS-forum 06.06.2018

# Dagens rammeavtale



# Dagens rammeavtale 2015-2019

- Gjelder fra 21. september 2015- 21 september 2019
- Alle prosjekter med antatt kostnad over 750 mill. kroner
- KS1 for konseptvalg. Det kan gis unntak for KVU/KS1.
- KS2 før investeringsbeslutning for valgt konsept. Obligatorisk for alle.
  
- Helseforetakene har egen ordning for kvalitetssikring.
- Nye veier og Bane Nor er selv ansvarlig for å gjennomføre KS2.

# Stort omfang


Perioden 2011-2014:  
123 KS-oppdrag

- 49 KS1
- 59 KS2
- 15 andre utredninger

Samferdselssektoren hadde  
53 % av oppdragene.

Perioden 2015 - i dag:  
Igangsatt 72 oppdrag

Fordeling per departement

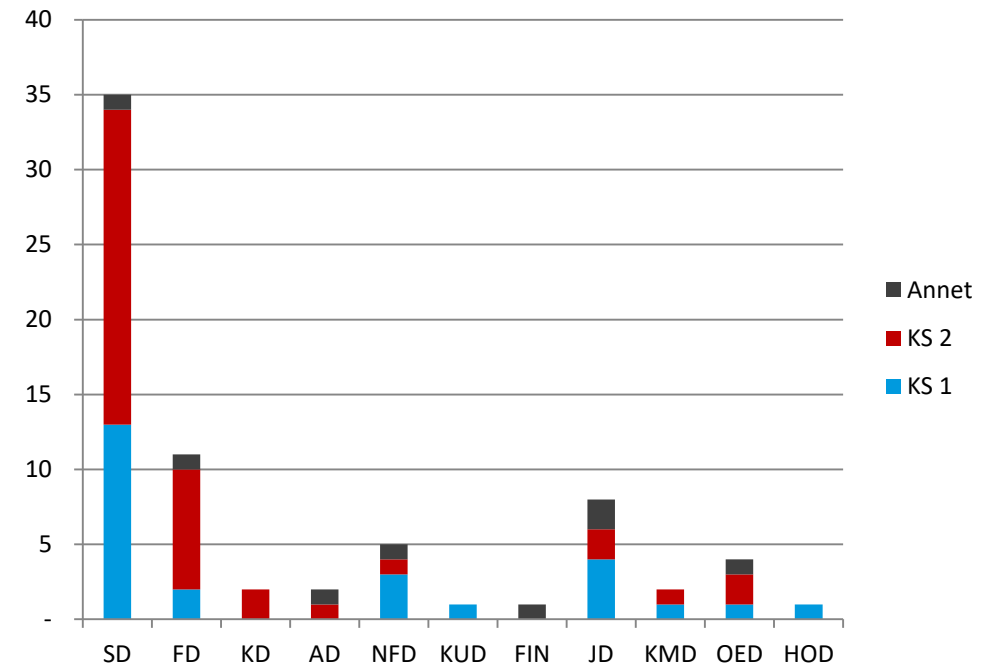

# Tidsbruk og kostnader

Ernst & Young sin kartlegging fra 2016, et utvalg av prosjekter

	Tidsbruk	Antall dager	Kostnad	Av totalkostnad
<b>KS1</b>	Total gjennomføringstid	290 dager	2.45 mill. kr	0,11 prosent
	Variasjon i gjennomføringstid	74 - 769 dager		
<b>KS2</b>	Total gjennomføringstid	195 dager	2.12 mill. kr	0,10 prosent
	Variasjon i gjennomføringstid	107 - 317 dager		

Nåværende rammeavtale:

21 leverte KS1: 247 kalenderdager

31 leverte KS2: 171 kalenderdager

Gjennomsnitt for oppdragene, fra oppstartsmøte til levert rapport.

# Neste rammeavtale



# Vedtatte tiltak inkluderes

- Mulighet for KS1 i to trinn
- Innføring av styringsmål (kostnadsstyrt prosjektutvikling for bygg) etter KS1
- Innføring av endringslogg mellom KS1 og KS2

Vi må høste erfaringer med hvordan tiltakene virker.

Prioritere ressurser til god implementering av tiltakene.

# Pågående prosesser: oppfølging av endringslogg og styringsmål

- Estimering av *bruketstyr* i bygg
  - ❑ Hvordan inkluderes bruketstyr i vurderingene i konseptfasen
  - ❑ Hvordan anslår vi bruketstyrprosjektet tidlig i prosjektet
- *Innsigelsessaker* i samferdselssektoren og betydningen for kostnadsvekst og håndtering av endringslogg

 Presentert i dag. Begge spørsmål løses innenfor dagens rammer for KS-ordningen



# Innspill som er kommet og skal vurderes

- Håndtering av IKT-prosjekter
- Terskelverdien og unntaksregler
- Fordeling av avrop
- Bedre oppfølging på kvalitet og tid: både kontroll, rutiner og veiledning

# Innspill konkurranse og juridiske problemstillinger

- Tydeligere skille krav og tildelingskriterier i konkurransegrunnlaget
- Tydeliggjøre omfanget av supplerende analyser og oppdrag utenom KS1 og KS2 (punkt 2.4 i rammeavtalen)
- Habilitetsbestemmelsen
- Offentlighet av tilbud

# Forankring av rammeavtalen

Regler og bestemmelser omtales ulike steder:

- Økonomiregelverket omtaler KS2
- Instruks for bygge- og leiesaker omtaler noe for bygg
- Hovedbudsjettskrivet

Samlede krav og regler for ordningen er ikke systematisk samlet og tilgjengeliggjort ett sted.



Mulige løsninger: Samle informasjon og utredningskrav i et rundskriv til departementene

# Mulige langsiktige utviklingsområder

- Oppfølging av arbeidet med kostnadskontroll mellom KS1 og KS2 og erfaringene med endringslogg og styringsmål.
- Erfaringer med kvalitetssikring utenfor FINs rammeavtale.
- Oppdatering av veiledningsmateriell og kompetansebygging i departementene

# Prosess for involvering

- Vektlegge god involvering av alle berørte parter
- Møte med alle departementene 10. april
- Skriftlige innspill fra departementene, eksterne kvalitetssikrere og Concept-programmet innen 20. april.
- Vurdere innspill og behov for oppfølgingsmøter med enkeltdepartementer eller flere sammen
- KS-seminar 6. juni



Finansdepartementet

**[ks-teamet@fin.dep.no](mailto:ks-teamet@fin.dep.no)**
